مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع	أمانة جدة	 شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم 27	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز   رقم المخطط :BLOCK10   رقم الشارع : PED-B10-24   عرض الشارع: 9.40

استلام الطبقة : TOP SUB GRADE   من محطة رقم :0+00   الى محطة رقم :0+46.05

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع :   التاريخ : / /

☐ المراقب   ☐ المساح   ☐ المختبر   توقيع المهندس المشرف ....

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : ....   الي المحطه : ....

مرفقات :   ☐ القطاع الطولي   ☐ القطاع العرضي   ☐ اخرى

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : ....   التوقيع: التاريخ : / /

من محطة :   الى محطة :

.... توقيع المساح :   التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد   ☐ مرفق   قيمه البركتور :   الرطوبه المثلي :

☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه :   ☐ ناجح   ☐ راسب   التوقيع : ....   التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

☐ موافق   ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....   مندوب المقاول : ....   التوقيع : ....   التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية

تقـــرير إســـتلام طـبقـــة ردم

إسم المشروع :-	تلال الغروب	رقم الشارع :-	PED-B10-24
رقم المخطط :-	BLOCK10	طول الشارع :-	46.05M
رقم الطبقة :-	TOP SUB-GRADE	عرض الشارع :-	9.400
	WIDHT-R	4.700	
	WIDHT-L	4.700	
LAYAER THICKNESS	0.150		
DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000		

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%		
				-2.000	-2.700	0.000	2.700	2.000		
1	0	529109.934	2369678.196	53.250	53.290	53.290	53.290	53.250	4.700	4.700
2	12.5	529114.735	2369689.737	53.354	53.314	53.314	53.314	53.354	4.700	4.700
3	25	529119.537	2369701.278	53.379	53.339	53.339	53.339	53.379	4.700	4.700
4	37.5	529124.338	2369712.819	53.403	53.363	53.363	53.363	53.403	4.700	4.700
5	46.1	529127.623	2369720.713	53.420	53.380	53.380	53.380	53.420	4.700	4.700

المقاول	**الإستشاري**
شركة طرق الرياض للمقاولات	**مكتب رمك للاستشارات الهندسية**
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-



BLOCK 10

FINISHING 0-10 CM

FINISHING 10-20 CM

FINISHING 20-30 CM

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

PED. B10-2

PED. B10-3

PED. B10-4

PED. B10-5

PED. B10-6

PED. B10-7

PED. B10-8

PED. B10-9

PED. B10-10

PED. B10-11

PED. B10-12

PED. B10-13

PED. B10-16

PED. B10-17

PED. B10-18

PED. B10-19

PED. B10-20

PED. B10-21

PED. B10-22

PED. B10-23

PED. B10-24

PED. B10-25

PED. B10-26


PED. B10-27

N:2370000 N:2369950 N:2369900 N:2369850 N:2369800 N:2369750 N:2369700 N:2369650 N:2369600

E:528900 E:528950 E:529000 E:529050 E:529100 E:529150 E:529200 E:529250 E:529300 E:529350





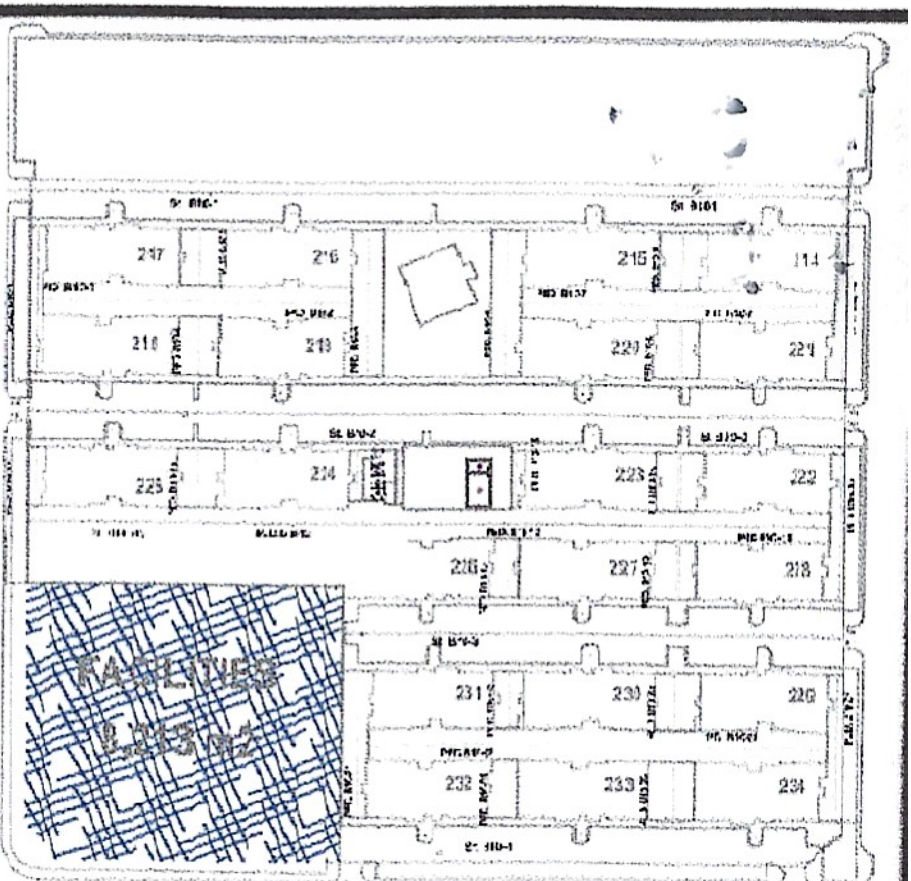



اتجاة تصريف المياة

الأرض الطبيعية

الخط التصميمى

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية

امانة مدينة جدة

الادارة العامة للطرق والانارة

ادارة تصميم الطرق




المالك/ وزارة الاسكان



المطور/ شركة ساني العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات المندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب

بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
تاريخ:	
رقم اللوحة:	

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:1500	مقياس الرسم:

مدير إدارة تصميم الطرق

مدير عام الدراسات والتصاميم

م /
